

**Państwowe Gospodarstwo Wodne**

**Wody Polskie**

**Nadzór Wodny w Łapach**

**ul. Armii Krajowej 1**


**18-100 Łapy**

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁAŃ PODEJMOWANYCH NA TERENIE  
NADZORU WODNEGO W ŁAPACH  
NA OBSZARACH POWIATÓW BIAŁOSTOCKIEGO, BIELSKIEGO, ŁOMŻYŃSKIEGO,  
MONIECKIEGO I WYSOKOMAZOWIECKIEGO  
NA ROK 2020**

## 1. Obszar działania Nadzoru Wodnego w łapach wraz z mapą i krótką charakterystyką.

Nadzór wodny w łapach obejmuje swoim zasięgiem głównie powiat białostocki, a także część powiatu bielskiego, monieckiego, łomżyńskiego i wysokomazowieckiego. Całkowita powierzchnia obszaru objęta zasięgiem Nadzoru Wodnego wynosi 1.772,200 km<sup>2</sup>.

Długość cieków na terenie administrowanym przez NW Łapy wynosi 403,434 km, na których jest zlokalizowanych 150 sztuk budowli piętrzących, które są eksploatowane i poddawane konserwacji w celu zachowania ich funkcji.

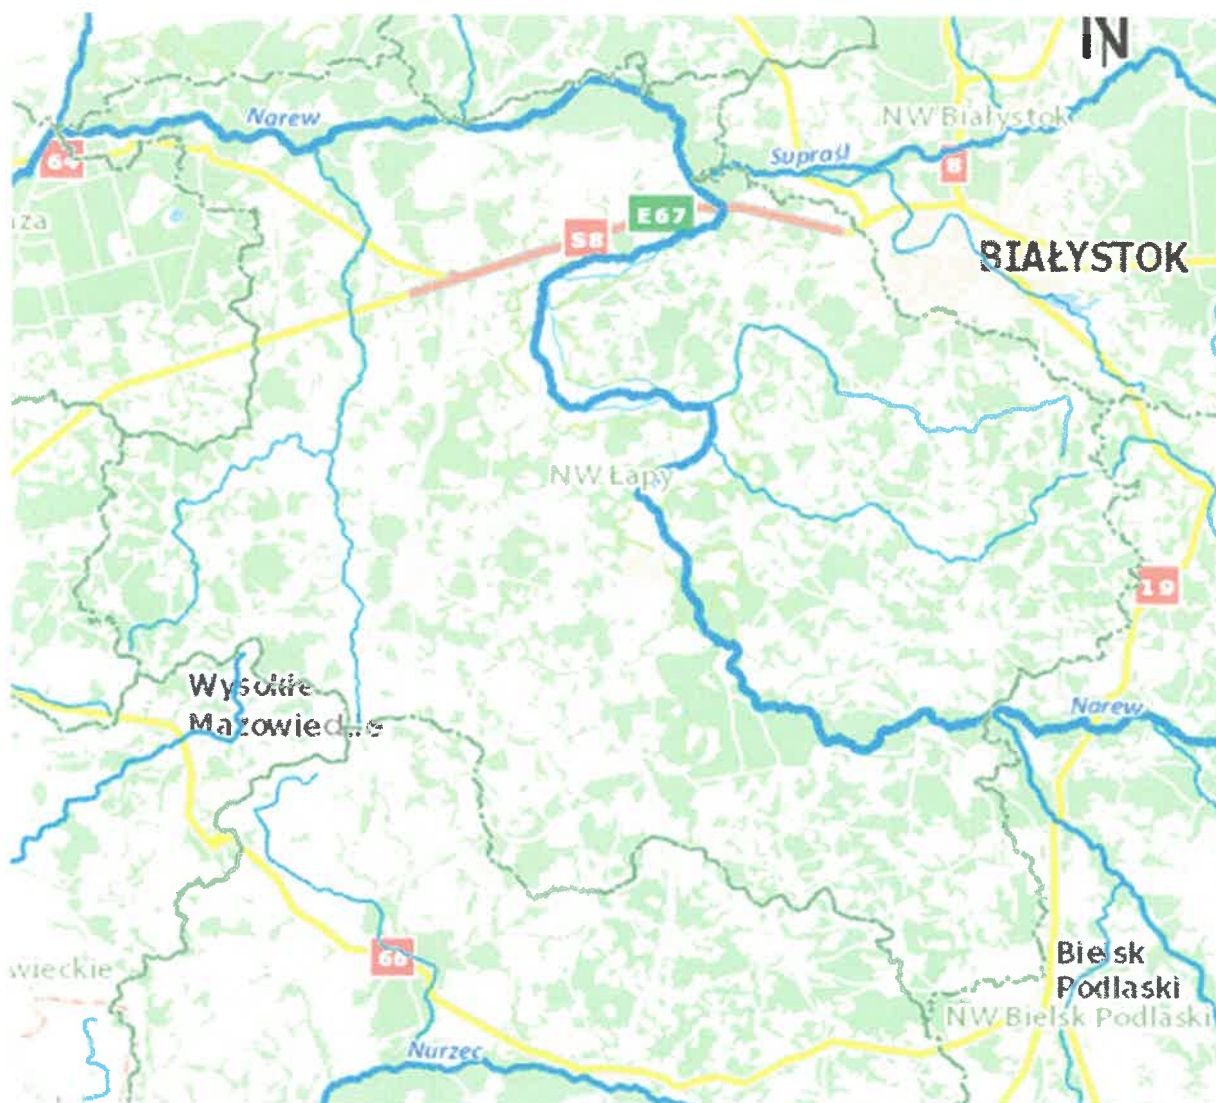

Źródło: Hydroportal - [https://wody.isok.gov.pl/imap\\_kzgw/](https://wody.isok.gov.pl/imap_kzgw/)

**2. Zestawienie części obszarów poszczególnych gmin znajdujących się na terenie działania Nadzoru Wodnego w łapach.**

Zarząd Zlewni	Nadzór Wodny	Powiat	Gmina
Białystok	Łapy	Białostocki	Białystok
			Choroszcz
			Dobrzyniewo Duże
			Juchnowiec Kościelny
			Łapy
Poświętne			
Surąż			
Turośl Kościelna			
Tykocin			
Zabłudów			
Zawady			
		Bielski	Bielsk Podlaski Wyszki
		Łomżyński	Rutki Wizna
		Moniecki	Krypno Trzcianne
		Wysokomazowiecki	Kobylin-Borzymy Kulesze Kościelne Nowe Piekuty Sokoły Wysokie Mazowieckie

### 3. Zakres prac wykonanych na terenie działania Nadzoru Wodnego w Łapach.

Lp.	Gmina	Nazwa zrealizowanego zadania	Rozmiar rzeczowy [km/szt]	Opis zadania	Wartość wykonywanych prac
<b>AWISSA</b>					
1	Łapy Sokoły	- konserwacja bieżąca	12,075 km	Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp rzeki i z dna cieku z wygrabianiem oraz usunięcie zatorów w korycie rzeki wraz z wywiezieniem urobku poza obręb obiektu ciągnikiem z przyczepą.	<b>30744,83 zł</b>
		- eksploatacja budowli piętrzących	4 szt.	Regulacja poziomów piętrzenia, oczyszczanie budowli z pływających zanieczyszczeń, dwukrotne pomalowanie ich elementów stalowych i transport oraz wykonanie i założenie szandorów.	
<b>ROKIETNICA</b>					
2	Kulesze Kościelne	- konserwacja bieżąca	5,480 km	Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp rzeki i z dna cieku oraz usunięcie zatorów w korycie rzeki wraz z wywiezieniem urobku poza obręb	<b>13145,26 zł</b>

				obiektu ciągnikiem z przyczepą	
<b>KANAŁ RYBAKI</b>					
3	Dobrzyniewo Duże	- konserwacja bieżąca	0,850 km	Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp rowów, koron, skarp nasypów i z dna cieku oraz usunięcie zatorów w korycie rzeki z oczyszczeniem budowli piętrzących i przejazdowych wraz z wywiezieniem urobku poza obręb obiektu ciągnikiem z przyczepą.	<b>3311,78 zł</b>
<b>KANAŁ A LIPNIKI</b>					
4	Choroszcz Tykocin	- konserwacja bieżąca	8,532 km	Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp rowów, koron, skarp nasypów i z dna cieku oraz usunięcie zatorów w korycie rzeki wraz z wywiezieniem urobku poza obręb obiektu ciągnikiem z przyczepą.	<b>24972.84 zł</b>
		- eksploatacja budowli piętrzących	8 szt.	Regulacja poziomów piętrzenia, oczyszczanie budowli z pływających zanieczyszczeń oraz wykonanie, założenie i transport szandorów.	

<b>HORODNIANKA</b>					
5	Choroszcz Juchnowiec Kościelny	- konserwacja bieżąca	21,498 km	Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp i z dna rzeki na wybranych odcinkach oraz usunięcie zatorów w korycie rzeki z wywiezieniem urobku poza obręb obiektu ciągnikiem z przyczepą.	57289,37 zł
		- eksploatacja budowli piętrzących	14 szt.	Regulacja poziomów piętrzenia, - oczyszczanie budowli z pływających zanieczyszczeń oraz wykonanie, założenie i transport szandorów.	
<b>SZEROKA STRUGA</b>					
6	Łąpy Poświętne Sokoły	- konserwacja bieżąca	11,34 km	Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp i dna cieku orz usunięcie zatorów w korycie rzeki z oczyszczeniem budowli piętrzących i przejazdowych wraz z wywiezieniem urobku poza obręb obiektu ciągnikiem z przyczepą.	31053,27 zł
		- eksploatacja budowli piętrzących	10 szt.	Regulacja poziomów piętrzenia, oczyszczanie budowli z pływających zanieczyszczeń oraz	

				wykonanie, założenie i transport szandorów na budowle.	
	<b>LIZA</b>				
7	Poświętne Suraż  Nowe Piekuty	- konserwacja bieżąca	11,212 km	Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp rowów, koron, skarp nasypów i z dna cieku oraz usunięcie zatorów w korycie rzeki z oczyszczeniem budowli piętrzących i przejazdowych wraz z wywiezieniem urobku poza obręb obiektu ciągnikiem z przyczepą.	<b>27359,82zł</b>
		- eksploatacja budowli piętrzących	5 szt.	Regulacja poziomów piętrzenia, oczyszczanie budowli z pływających zanieczyszczeń, dwukrotne pomalowanie ich elementów stalowych oraz wykonanie, złożenie i transport szandorów ciągnikiem z przyczepą.	
	<b>KANAŁ E SURAŻ</b>				
8	Suraż  Poświętne	- konserwacja bieżąca	3,276 km  3,276 km	Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp rowów, koron, skarp nasypów i z dna cieku oraz usunięcie zatorów w	<b>15578,29 zł</b>

				<p>korycie rzeki z oczyszczeniem budowli piętrzących i przejazdowych wraz z wywiezieniem urobku poza obręb obiektu ciągnikiem z przyczepą.</p>	
	<b>RÓW NR.1</b>				
9	Dobrzyniewo Duże	- konserwacja bieżąca	4,279 km	<p>Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp, rowów, koron i skarp nasypów, z dna cieku, usunięcie zatorów w korycie rzeki z oczyszczeniem budowli piętrzących i przejazdowych wraz z wywiezieniem urobku poza obręb obiektu ciągnikiem z przyczepą.</p>	<b>14338,93 zł</b>
		-eksploatacja budowli piętrzących	1 szt.	<p>Regulacja poziomów piętrzenia, oczyszczenie budowli z pływających zanieczyszczeń oraz zwiezienie szandorów do miejsca składowania ciągnikiem z przyczepą, wykonanie i założenie szandorów</p>	



<b>KANAŁ A TYKOCIN</b>					
10	Tykocin	- konserwacja bieżąca	0,447 km	Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp rowów, koron i skarp nasypów, z dna ciekę oraz usunięcie zatorów w korycie rzeki z oczyszczeniem budowli piętrzących i przejazdowych wraz z wywiezieniem urobku poza obręb obiektu ciągnikiem z przyczepą.	<b>1843,40 zł</b>
<b>WAŁ KONOWAŁY</b>					
11	Choroszcz	- konserwacja bieżąca	1,145 km	Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp wału	<b>1760,44 zł</b>
<b>CZAPLINIANKA</b>					
12	Choroszcz Turośń Kościelna	- konserwacja bieżąca	4,102 km	Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp i z dna ciekę oraz usunięcie zatorów w korycie rzeki wraz z wywiezieniem urobku poza obręb obiektu ciągnikiem z przyczepą.	<b>12919,43 zł</b>
<b>CIEK SPOD KRYNICKICH</b>					
13	Juchnowiec Kościelny Zabłudów	- konserwacja bieżąca	6,489 km	Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp rzeki i z dna ciekę oraz usunięcie zatorów w korycie rzeki z oczyszczeniem budowli piętrzących	<b>17886,61 zł</b>

				i przejazdowych wraz z wywiezieniem urobku poza obręb obiektu ciągnikiem z przyczepą.	
		- eksploatacja budowli piętrzących	3 szt.	Oczyszczanie budowli z pływających zanieczyszczeń, czyszczenie betonów z mchu wraz z obkoszeniem budowli piętrzących, oraz wykonanie i uzupełnienie szandorów, transport szandorów ciągnikiem z przyczepą.	
	<b>KOWALÓWKA</b>				
14	Turośń Kościelna Suraż	- konserwacja bieżąca	8,264 km	Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp rowów, koron, skarp nasypów i z dna cieku oraz usunięcie zatorów w korycie rzeki z oczyszczeniem budowli piętrzących i przejazdowych wraz z wywiezieniem urobku poza obręb obiektu ciągnikiem z przyczepą.	<b>21636,59zł</b>
		- eksploatacja budowli piętrzących	4 szt.	Oczyszczanie budowli z pływających zanieczyszczeń, czyszczenie betonów z mchu	

				wraz z obkoseniem budowli piętrzących, wykonanie i uzupełnienie szandorów, transport ciągnikiem z przyczepką.	
<b>TUROŚNIANKA</b>					
15	Juchnowiec Kościelny	- konserwacja bieżąca	1,40 km	Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp i z dna cieku oraz usunięcie zatorów w korycie rzeki w okresie spływu wód wraz z wywiezieniem urobku poza obręb obiektu ciągnikiem z przyczepą, mechaniczne usuwanie zatorów koparką kołową.	<b>9687,48 zł</b>
	Turośń Kościelna	- eksploatacja budowli piętrzących	3 szt.	Regulacja poziomów piętrzenia, oczyszczanie budowli z pływających zanieczyszczeń oraz wykonanie, założenie i transport szandorów ciągnikiem z przyczepą.	
<b>KANAŁ A KONOWAŁY</b>					
16	Choroszcz Turośń Kościelna	- konserwacja bieżąca	4,306 km	Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp rowów, koron, skarp nasypów i z dna cieku oraz usunięcie zatorów w korycie rzeki z wraz z wywiezieniem	<b>12028,91 zł</b>

				urobku poza obręb obiektu ciągnikiem z przyczepką.	
		- eksploatacja budowli piętrzących	2 szt.	Regulacja poziomów piętrzenia, oczyszczanie budowli z pływających zanieczyszczeń oraz transport szandorów na budowlę i ich miejsca składowania ciągnikiem z przyczepką, wykonanie i założenie szandorów.	
<b>NIEWODNICZANKA</b>					
17	Juchnowiec Kościelny Zabłudów	- konserwacja bieżąca	6,900 km	Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp i z dna cieku oraz usunięcie zatorów w korycie rzeki z oczyszczeniem budowli piętrzących i przejazdowych wraz z wywiezieniem urobku poza obręb obiektu ciągnikiem z przyczepką.	<b>18280,26 zł</b>
		- eksploatacja budowli piętrzących	2 szt.	Regulacja poziomów piętrzenia, oczyszczanie budowli z pływających zanieczyszczeń, transport szandorów na budowlę i ich miejsca składowania	

				ciągnikiem z przyczepką, wykonanie i założenie szandorów.	
	<b>ŚLINA</b>				
18	Kobylin Borzymy, Sokoły, Tykocin, Wysokie Mazowieckie, Zawady	- eksploatacja budowli piętrzących	3 szt.	Regulacja poziomów piętrzenia, oczyszczanie budowli z pływających zanieczyszczeń oraz zwiezenie szandorów do miejsca składowania, wykonanie, założenie i transport szandorów ciągnikiem z przyczepką.	<b>2767,50 zł</b>
	<b>PULSZANKA</b>				
19	Bielsk Podlaski, Wyszki	- eksploatacja budowli piętrzących	3 szt.	Regulacja poziomów piętrzenia, oczyszczanie budowli z pływających zanieczyszczeń oraz wykonanie, założenie i transport szandorów ciągnikiem z przyczepką.	<b>2767,50 zł</b>
20	<b>KANAŁ WAŁĘGA</b>				

	Bielsk Podlaski  Wyszki	- eksploatacja budowli piętrzących	5 szt.	Regulacja poziomów piętrzenia, oczyszczanie budowli z pływających zanieczyszczeń, transport szandorów , oraz oczyszczenie i dwukrotne pomalowanie elementów stalowych budowli oraz wykonanie, założenie i transport szandorów ciągnikiem z przyczepką.	<b>3321,00 zł</b>
<b>GRUDA</b>					
21	Łapy Poświętne Sokoły	- eksploatacja budowli piętrzących	5 szt.	Regulacja poziomów piętrzenia, oczyszczanie budowli z pływających zanieczyszczeń oraz zwiezenie szandorów do miejsca składowania, wykonanie, założenie i transport szandorów.	<b>3321,00 zł</b>
<b>Łącznie</b>					<b>326014,51 zł</b>

**4. Ilość spraw wpływających i prowadzonych przez Nadzór Wodny.**

Kwartał	Zgody wodnoprawne na podstawie art. 397 ust. 3 pkt 3 (w związku z art. 240 ust. 5 pkt 1)	Ilość spraw wpływających do NW (wnioski, skargi, inne)
I	3	
II	12	
III	4	
IV	8	
ROCZNIE	27	
